

Avance físico real 85.21% al 04/2018

Proy. de inversión pública
Código SNIP: 308737

Expedientes de obra

Proceso de selección SEACE
Código INFObras: 45789

Inicio de obra

16/03/2015
Aprobación del proyecto
S/ 4 654,035.00

16/03/2015
Verificación del proyecto
S/ 4 685,565.00

11/01/2017
Expediente 1
S/ 5 674,051.23

22/03/2016
Contratación de proveedor para expediente
S/ 215 927.00

11/05/2017
Inicio de Obra

Ejecución
Avances de obra

06/2017 Avance 1 S/ 313,017.29
07/2017 Avance 2 S/ 681,840.26
08/2017 Avance 3 S/ 1,285,189.27
09/2017 Avance 4 S/ 1,707,881.85
10/2017 Avance 5 S/ 1,981,401.72
11/2017 Avance 6 S/ 2,480,665.36
12/2017 Avance 7 S/ 3,314,268.49
01/2018 Avance 8 S/ 3,555,174.55
02/2018 Avance 9 S/ 3,786,875.39
03/2018 Avance 10 S/ 4,162,591.04
04/2018 Avance 11 S/ 4,835,231.94



Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	06/2017	25/08/2017	24.26 %	5.52 %	1,376,124.48	313,017.29	Ejecución	Ver	Eliminar
002	07/2017	31/08/2017	43.30 %	12.02 %	2,456,421.18	681,840.26	Ejecución	Ver	Eliminar
003	08/2017	28/10/2017	25.59 %	22.59 %	1,451,910.65	1,285,189.27	Ejecución	Ver	Eliminar
004	09/2017	28/10/2017	48.15 %	30.07 %	2,732,223.57	1,707,881.85	Ejecución	Ver	Eliminar
005	10/2017	24/11/2017	84.21 %	34.92 %	4,778,028.07	1,981,401.72	Ejecución	Ver	Eliminar
006	11/2017	06/01/2018	100 %	43.72 %	5,674,051.23	2,480,665.36	Ejecución	Ver	Eliminar
007	12/2017	19/01/2018	100 %	58.41 %	5,674,051.23	3,314,268.49	Ejecución	Ver	Eliminar
008	01/2018	26/03/2018	100 %	62.66 %	5,674,051.23	3,555,174.55	Ejecución	Ver	Eliminar
009	02/2018	26/03/2018	100 %	66.74 %	5,674,051.23	3,786,875.39	Ejecución	Ver	Eliminar
010	03/2018	27/04/2018	100 %	73.36 %	5,674,051.23	4,162,591.04	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 85.21% al 04/2018



Avances de obra

- Agregar Avance
- Finalizar Obra
- Obra paralizada

Nº	Período	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
011	04/2018	18/05/2018	100 %	85.21 %	5,674,051.23	4,835,231.94	Ejecución	Ver	Eliminar


1

2



Línea de tiempo

Avance físico real 82.40% al 04/2018

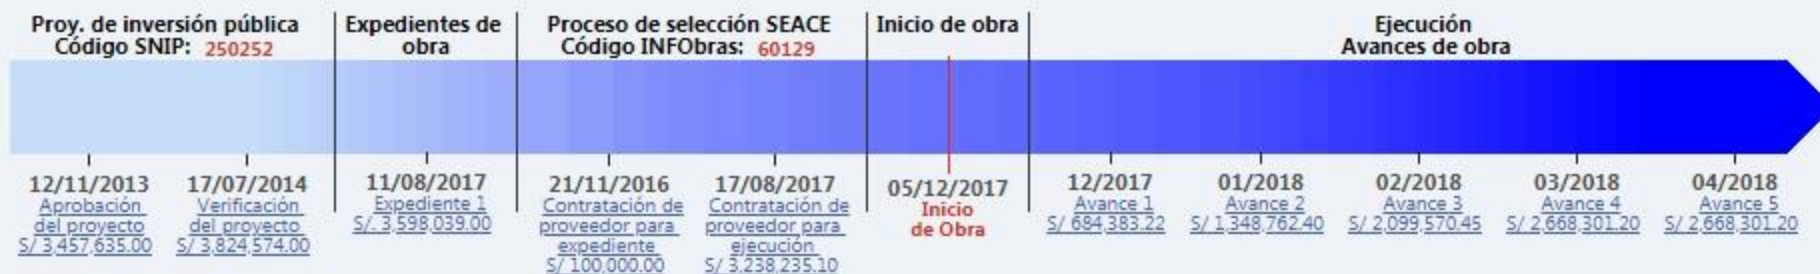

Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	12/2017	12/01/2018	21.63 %	21.13 %	700,440.22	684,383.22	Ejecución	Ver	Eliminar
002	01/2018	19/03/2018	51.87 %	41.65 %	1,679,619.84	1,348,762.40	Ejecución	Ver	Eliminar
003	02/2018	19/03/2018	77.14 %	64.84 %	2,497,830.42	2,099,570.45	Ejecución	Ver	Eliminar
004	03/2018	27/04/2018	98.14 %	82.40 %	3,178,155.10	2,668,301.20	Ejecución	Ver	Eliminar
005	04/2018	18/05/2018	98.14 %	82.40 %	3,178,155.10	2,668,301.20	Paralizada	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 99.60% al 04/2018



Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada ☒

Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	01/2018	28/02/2018	6.11 %	11.25 %	55,381.84	101,899.45	Ejecución	Ver	Eliminar
002	02/2018	14/03/2018	31.30 %	42.93 %	228,204.13	389,034.20	Ejecución	Ver	Eliminar
003	03/2018	17/04/2018	66.23 %	75.77 %	600,067.04	686,518.25	Ejecución	Ver	Eliminar
004	04/2018	17/05/2018	100 %	99.60 %	906,108.37	902,467.40	Ejecución	Ver	Eliminar

Avance físico real 62.91% al 05/2018

Proy. de inversión pública
Código SNIP: 236980

Expedientes de obra

Proceso de selección SEACE
Código INFObras: 62294

Inicio de obra

09/11/2012
Aprobación del proyecto
S/ 9,808,352.00

02/09/2016
Verificación del proyecto
S/ 8,417,480.00

22/09/2016
Expediente 1
S/ 8,140,600.05

14/11/2016
Contratación de proveedor para ejecución
S/ 8,139,308.55

25/11/2016
Contratación de proveedor para expediente
S/ 270,000.00

08/03/2017
Inicio de Obra

Ejecución
Avances de obra

03/2017 Avance 1 S/ 339,712.23	04/2017 Avance 2 S/ 1,233,386.26	05/2017 Avance 3 S/ 2,046,283.22	06/2017 Avance 4 S/ 3,023,410.27	07/2017 Avance 5 S/ 3,710,404.98	08/2017 Avance 6 S/ 4,288,006.21	09/2017 Avance 7 S/ 4,672,105.57	10/2017 Avance 8 S/ 4,672,105.57	11/2017 Avance 9 S/ 4,672,105.57	12/2017 Avance 10 S/ 4,672,105.57	01/2018 Avance 11 S/ 4,672,105.57	02/2018 Avance 12 S/ 4,672,105.57
03/2018 Avance 13 S/ 4,672,105.57	04/2018 Avance 14 S/ 4,809,081.56	05/2018 Avance 15 S/ 5,120,293.50									



Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada ☒

Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	03/2017	05/05/2017	1.87 %	4.17 %	152,279.48	339,712.23	Ejecución	Ver	Eliminar
002	04/2017	30/05/2017	15.77 %	15.15 %	1,283,568.96	1,233,386.26	Ejecución	Ver	Eliminar
003	05/2017	10/06/2017	31.30 %	25.14 %	2,547,196.61	2,046,283.22	Ejecución	Ver	Eliminar
004	06/2017	15/07/2017	46.31 %	37.15 %	3,768,906.82	3,023,410.27	Ejecución	Ver	Eliminar
005	07/2017	29/08/2017	64.30 %	45.59 %	5,233,168.43	3,710,404.98	Ejecución	Ver	Eliminar
006	08/2017	26/10/2017	61.93 %	52.68 %	5,038,740.13	4,288,006.21	Ejecución	Ver	Eliminar
007	09/2017	26/10/2017	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Ejecución	Ver	Eliminar
008	10/2017	04/12/2017	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Paralizada	Ver	Eliminar
009	11/2017	06/12/2017	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Paralizada	Ver	Eliminar
010	12/2017	12/01/2018	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Paralizada	Ver	Eliminar



Agregar Avance

Obra Finalizada



Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
011	01/2018	15/03/2018	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Paralizada	Ver	Eliminar
012	02/2018	15/03/2018	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Paralizada	Ver	Eliminar
013	03/2018	28/05/2018	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Paralizada	Ver	Eliminar
014	04/2018	30/05/2018	100 %	59.08 %	8,139,308.55	4,809,081.56	Ejecución	Ver	Eliminar
015	05/2018	05/06/2018	100 %	62.91 %	8,139,308.55	5,120,293.50	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 77.64% al 04/2018



Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	04/2018	18/05/2018	46 %	77.64 %	158,236.69	267,067.01	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 25.34% al 04/2018



Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	10/2017	23/03/2018	0.43 %	0.43 %	131,457.16	139,461.46	Ejecución	Ver	Eliminar
002	11/2017	23/03/2018	3.06 %	4.23 %	928,556.29	1,515,657.83	Ejecución	Ver	Eliminar
003	12/2017	23/03/2018	6.56 %	7.36 %	1,989,201.61	2,537,172.01	Ejecución	Ver	Eliminar
004	01/2018	23/03/2018	11.42 %	10.81 %	3,461,458.05	3,657,770.75	Ejecución	Ver	Eliminar
005	02/2018	23/03/2018	17.71 %	16.04 %	5,367,996.93	5,358,513.02	Ejecución	Ver	Eliminar
006	03/2018	18/04/2018	25.80 %	22.80 %	7,818,709.38	7,573,341.22	Ejecución	Ver	Eliminar
007	04/2018	18/05/2018	25.34 %	25.34 %	8,408,878.85	8,408,878.85	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 100% al 03/2018

Proy. de inversión pública
Código SNIP:

Expedientes de
obra

Inicio de obra

Ejecución
Avances de obra

Aprobación
del proyecto
S/ 0.00

Verificación
del proyecto
S/ 0.00

23/02/2018
Expediente 1
S/ 130 018.74

22/03/2018
Inicio
de Obra

03/2018
Avance 1
S/ 129 842.44



Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada



Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	03/2018	31/05/2018	100 %	100 %	129,842.44	129,842.44	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 99.60% al 04/2018



Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	01/2018	28/02/2018	6.11 %	11.25 %	55,381.84	101,899.45	Ejecución	Ver	Eliminar
002	02/2018	14/03/2018	31.30 %	42.93 %	228,204.13	389,034.20	Ejecución	Ver	Eliminar
003	03/2018	17/04/2018	66.23 %	75.77 %	600,067.04	686,518.25	Ejecución	Ver	Eliminar
004	04/2018	17/05/2018	100 %	99.60 %	906,108.37	902,467.40	Ejecución	Ver	Eliminar
