



Línea de tiempo

Avance físico real 100% al 12/2017

Proy. de inversión pública
Código SNIP: 300703

Expedientes de obra

Proceso de selección SEACE
Código INFObras: 75215

Inicio de obra

Ejecución
Avances de obra

26/09/2014
Aprobación del proyecto
S/ 399,117.00

28/06/2017
Verificación del proyecto
S/ 285,502.00

20/07/2017
Expediente 1
S/ 249,614.42

11/10/2017
Contratación de proveedor para ejecución
S/ 246,292.46

30/11/2017
Inicio de Obra

12/2017
Avance 1
S/ 246,292.46



Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada



Obra paralizada

Nº	Período	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	12/2017	11/01/2018	65.25 %	100 %	160,705.83	246,292.46	Ejecución	Ver	Eliminar

Avance físico real 97.25% al 09/2017



12/2014 Avance 1 S/ 37.43	01/2015 Avance 2 S/ 1.026.481.55	02/2015 Avance 3 S/ 966.326.10	03/2015 Avance 4 S/ 1.360.825.35	04/2015 Avance 5 S/ 1.405.517.74	05/2015 Avance 6 S/ 1.405.517.74	06/2015 Avance 7 S/ 1.405.517.74	07/2015 Avance 8 S/ 1.405.517.74	08/2015 Avance 9 S/ 1.405.517.74	09/2015 Avance 10 S/ 1.841.436.91	10/2015 Avance 11 S/ 1.929.479.31	11/2015 Avance 12 S/ 1.929.479.31
12/2015 Avance 13 S/ 1.929.479.31	01/2016 Avance 14 S/ 1.929.479.31	02/2016 Avance 15 S/ 1.929.479.31	03/2016 Avance 16 S/ 1.929.479.31	04/2016 Avance 17 S/ 1.929.479.31	05/2016 Avance 18 S/ 1.929.479.31	06/2016 Avance 19 S/ 1.929.479.31	07/2016 Avance 20 S/ 1.929.479.31	08/2016 Avance 21 S/ 1.929.479.31	09/2016 Avance 22 S/ 1.929.479.31	10/2016 Avance 23 S/ 1.929.479.31	11/2016 Avance 24 S/ 1.929.479.31
12/2016 Avance 25 S/ 1.929.479.31	01/2017 Avance 26 S/ 1.929.479.31	02/2017 Avance 27 S/ 1.929.479.31	03/2017 Avance 28 S/ 1.929.479.31	04/2017 Avance 29 S/ 1.929.479.31	05/2017 Avance 30 S/ 1.929.479.31	06/2017 Avance 31 S/ 1.929.479.31	07/2017 Avance 32 S/ 1.929.479.31	08/2017 Avance 33 S/ 1.929.479.31	09/2017 Avance 34 S/ 1.940.447.97		



Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada ☒

Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	12/2014	31/07/2015	51.45 %	8.27 %	746,814.73	37.43	Ejecución	Ver	Eliminar
002	01/2015	31/07/2015	51.45 %	51.45 %	1,026,481.55	1,026,481.55	Ejecución	Ver	Eliminar
003	02/2015	31/07/2015	69.48 %	57.15 %	1,385,912.28	966,326.10	Ejecución	Ver	Eliminar
004	03/2015	30/11/2015	88.75 %	68.20 %	1,770,684.28	1,360,825.35	Ejecución	Ver	Eliminar
005	04/2015	30/11/2015	91.33 %	70.44 %	1,822,158.82	1,405,517.74	Ejecución	Ver	Eliminar
006	05/2015	31/12/2015	91.33 %	70.44 %	1,822,158.82	1,405,517.74	Paralizada	Ver	Eliminar
007	06/2015	31/12/2015	91.33 %	70.44 %	1,822,158.82	1,405,517.74	Paralizada	Ver	Eliminar
008	07/2015	31/12/2015	91.33 %	70.44 %	1,822,158.82	1,405,517.74	Paralizada	Ver	Eliminar
009	08/2015	31/12/2015	91.33 %	70.44 %	1,822,158.82	1,405,517.74	Paralizada	Ver	Eliminar
010	09/2015	31/12/2015	92.15 %	92.29 %	1,838,583.84	1,841,436.91	Ejecución	Ver	Eliminar

[Agregar Avance](#)[Obra Finalizada](#)[Obra paralizada](#)

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
011	10/2015	31/12/2015	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Ejecución	Ver	Eliminar
012	11/2015	15/02/2016	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar
013	12/2015	15/02/2016	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar
014	01/2016	15/02/2016	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar
015	02/2016	09/07/2016	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar
016	03/2016	09/07/2016	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar
017	04/2016	09/07/2016	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar
018	05/2016	09/07/2016	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar
019	06/2016	09/07/2016	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar
020	07/2016	12/08/2016	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar

[1](#) **[2](#)** [3](#) [4](#)

[Agregar Avance](#)[Obra Finalizada](#)[Obra paralizada](#)

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
031	06/2017	11/07/2017	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar
032	07/2017	31/08/2017	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar
033	08/2017	08/12/2017	96.70 %	96.70 %	1,929,479.31	1,929,479.31	Paralizada	Ver	Eliminar
034	09/2017	08/12/2017	97.25 %	97.25 %	1,940,447.97	1,940,447.97	Ejecución	Ver	Eliminar

[1](#) [2](#) [3](#) **[4](#)**



Línea de tiempo

Avance físico real 82.40% al 03/2018

Proy. de inversión pública
Código SNIP: 250252

Expedientes de obra

Proceso de selección SEACE
Código INFObras: 60129

Inicio de obra

Ejecución
Avances de obra

12/11/2013
Aprobación
del proyecto
S/ 3,457,635.00

17/07/2014
Verificación
del proyecto
S/ 3,824,574.00

11/08/2017
Expediente 1
S/ 3,598,039.00

21/11/2016
Contratación de
proveedor para
expediente
S/ 100,000.00

17/08/2017
Contratación de
proveedor para
ejecución
S/ 3,238,235.10

05/12/2017
Inicio
de Obra

12/2017
Avance 1
S/ 684,383.22

01/2018
Avance 2
S/ 1,348,762.40

02/2018
Avance 3
S/ 2,099,570.45

03/2018
Avance 4
S/ 2,668,301.20



Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	12/2017	12/01/2018	21.63 %	21.13 %	700,440.22	684,383.22	Ejecución	Ver	Eliminar
002	01/2018	19/03/2018	51.87 %	41.65 %	1,679,619.84	1,348,762.40	Ejecución	Ver	Eliminar
003	02/2018	19/03/2018	77.14 %	64.84 %	2,497,830.42	2,099,570.45	Ejecución	Ver	Eliminar
004	03/2018	27/04/2018	98.14 %	82.40 %	3,178,155.10	2,668,301.20	Ejecución	Ver	Eliminar

Avance físico real 73.36% al 03/2018

Proy. de inversión pública
Código SNIP: 308737

Expedientes de obra

Proceso de selección SEACE
Código INFObras: 45789

Inicio de obra

16/03/2015
Aprobación del proyecto
S/ 4,654,035.00

16/03/2015
Verificación del proyecto
S/ 4,685,565.00

11/01/2017
Expediente 1
S/ 5,674,051.23

22/03/2016
Contratación de proveedor para expediente
S/ 215,927.00

11/05/2017
Inicio de Obra

Ejecución
Avances de obra

06/2017
Avance 1
S/ 313,017.29

07/2017
Avance 2
S/ 681,840.26

08/2017
Avance 3
S/ 1,285,189.27

09/2017
Avance 4
S/ 1,707,881.85

10/2017
Avance 5
S/ 1,981,401.72

11/2017
Avance 6
S/ 2,480,665.36

12/2017
Avance 7
S/ 3,314,268.49

01/2018
Avance 8
S/ 3,555,174.55

02/2018
Avance 9
S/ 3,786,875.39

03/2018
Avance 10
S/ 4,162,591.04



Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	06/2017	25/08/2017	24.26 %	5.52 %	1,376,124.48	313,017.29	Ejecución	Ver	Eliminar
002	07/2017	31/08/2017	43.30 %	12.02 %	2,456,421.18	681,840.26	Ejecución	Ver	Eliminar
003	08/2017	28/10/2017	25.59 %	22.59 %	1,451,910.65	1,285,189.27	Ejecución	Ver	Eliminar
004	09/2017	28/10/2017	48.15 %	30.07 %	2,732,223.57	1,707,881.85	Ejecución	Ver	Eliminar
005	10/2017	24/11/2017	84.21 %	34.92 %	4,778,028.07	1,981,401.72	Ejecución	Ver	Eliminar
006	11/2017	06/01/2018	100 %	43.72 %	5,674,051.23	2,480,665.36	Ejecución	Ver	Eliminar
007	12/2017	19/01/2018	100 %	58.41 %	5,674,051.23	3,314,268.49	Ejecución	Ver	Eliminar
008	01/2018	26/03/2018	100 %	62.66 %	5,674,051.23	3,555,174.55	Ejecución	Ver	Eliminar
009	02/2018	26/03/2018	100 %	66.74 %	5,674,051.23	3,786,875.39	Ejecución	Ver	Eliminar
010	03/2018	27/04/2018	100 %	73.36 %	5,674,051.23	4,162,591.04	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 100% al 01/2018

Proy. de inversión pública
Código SNIP:

Expedientes de
obra

Inicio de obra

Ejecución
Avances de obra

Aprobación
del proyecto
S/ 0.00

Verificación
del proyecto
S/ 0.00

11/07/2017
Expediente 1
S/ 311.119.27

24/11/2017
**Inicio
de Obra**

12/2017
Avance 1
S/ 296.588.14

01/2018
Avance 2
S/ 311.119.27



Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada



Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	12/2017	19/01/2018	91.99 %	95.33 %	286,196.82	296,588.14	Ejecución	Ver	Eliminar
002	01/2018	14/03/2018	100 %	100 %	311,119.27	311,119.27	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 98.63% al 12/2017

Proy. de inversión pública
Código SNIP:

Expedientes de
obra

Inicio de obra

Ejecución
Avances de obra

Aprobación
del proyecto
S/ 0.00

Verificación
del proyecto
S/ 0.00

01/06/2017
Expediente 1
S/ 149,825.06

24/11/2017
Inicio
de Obra

12/2017
Avance 1
S/ 147,773.04



Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada



Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	12/2017	15/01/2018	100 %	98.63 %	149,825.06	147,773.04	Ejecución	Ver	Eliminar



Avance físico real 57.40% al 02/2018



Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	03/2017	05/05/2017	1.87 %	4.17 %	152,279.48	339,712.23	Ejecución	Ver	Eliminar
002	04/2017	30/05/2017	15.77 %	15.15 %	1,283,568.96	1,233,386.26	Ejecución	Ver	Eliminar
003	05/2017	10/06/2017	31.30 %	25.14 %	2,547,196.61	2,046,283.22	Ejecución	Ver	Eliminar
004	06/2017	15/07/2017	46.31 %	37.15 %	3,768,906.82	3,023,410.27	Ejecución	Ver	Eliminar
005	07/2017	29/08/2017	64.30 %	45.59 %	5,233,168.43	3,710,404.98	Ejecución	Ver	Eliminar
006	08/2017	26/10/2017	61.93 %	52.68 %	5,038,740.13	4,288,006.21	Ejecución	Ver	Eliminar
007	09/2017	26/10/2017	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Ejecución	Ver	Eliminar
008	10/2017	04/12/2017	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Paralizada	Ver	Eliminar
009	11/2017	06/12/2017	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Paralizada	Ver	Eliminar
010	12/2017	12/01/2018	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Paralizada	Ver	Eliminar

[Agregar Avance](#)[Finalizar Obra](#)[Obra paralizada](#)

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
011	01/2018	15/03/2018	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Paralizada	Ver	Eliminar
012	02/2018	15/03/2018	98.35 %	57.40 %	8,003,076.31	4,672,105.57	Paralizada	Ver	Eliminar

[1](#)[2](#)



Línea de tiempo

Avance físico real 97.41% al 08/2017



Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada



Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	01/2017	24/02/2017	8.42 %	19.98 %	191,430.05	454,150.81	Ejecución	Ver	Eliminar
002	02/2017	17/03/2017	32.60 %	29.66 %	740,965.52	674,375.90	Ejecución	Ver	Eliminar
003	03/2017	15/05/2017	91.25 %	32.05 %	2,074,125.87	728,623.62	Ejecución	Ver	Eliminar
004	04/2017	13/11/2017	91.25 %	32.05 %	2,074,125.87	728,623.62	Paralizada	Ver	Eliminar
005	05/2017	13/11/2017	64.51 %	51 %	1,466,474.40	1,159,285.19	Ejecución	Ver	Eliminar
006	06/2017	13/11/2017	64.51 %	51 %	1,466,474.40	1,159,285.19	Paralizada	Ver	Eliminar
007	07/2017	15/11/2017	99.54 %	61.46 %	2,262,655.92	1,397,049.35	Ejecución	Ver	Eliminar
008	08/2017	15/11/2017	100 %	97.41 %	2,273,083.65	2,214,308.12	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 100% al 12/2017



Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada ☒

Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	10/2017	20/12/2017	15.99 %	28.34 %	59,850.85	108,108.76	Ejecución	Ver	Eliminar
002	11/2017	20/12/2017	61.19 %	96.39 %	233,426.49	367,677.55	Ejecución	Ver	Eliminar
003	12/2017	22/01/2018	96.39 %	100 %	367,677.55	381,464.74	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 100% al 01/2018



Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada ☒


Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	09/2017	18/10/2017	3.78 %	17.92 %	52,087.99	247,194.88	Ejecución	Ver	Eliminar
002	10/2017	24/11/2017	25.39 %	47.18 %	350,216.86	650,839.53	Ejecución	Ver	Eliminar
003	11/2017	07/12/2017	52.77 %	82.04 %	727,896.75	1,131,636.91	Ejecución	Ver	Eliminar
004	12/2017	16/01/2018	80.14 %	96.46 %	1,105,365.53	1,330,555.42	Ejecución	Ver	Eliminar
005	01/2018	15/03/2018	100 %	100 %	1,379,349.57	1,379,349.57	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 100% al 11/2017

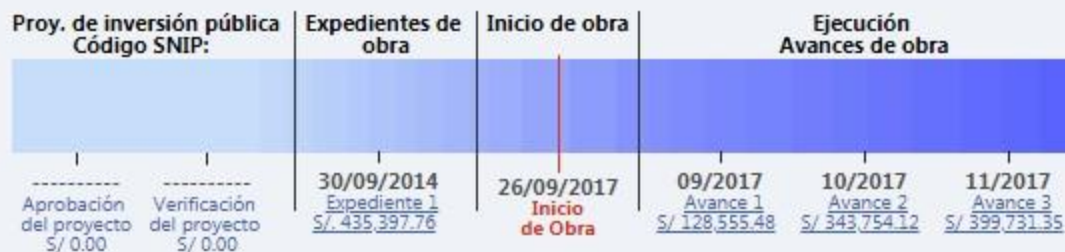

Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada



Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	09/2017	05/01/2018	22.24 %	27.25 %	104,899.20	128,555.48	Ejecución	Ver	Eliminar
002	10/2017	05/01/2018	76.16 %	72.87 %	359,257.18	343,754.12	Ejecución	Ver	Eliminar
003	11/2017	05/01/2018	100 %	100 %	399,731.35	399,731.35	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo


Avance físico real 100% al 02/2018

Proy. de inversión pública
Código SNIP:

Expedientes de
obra

Inicio de obra

Ejecución
Avances de obra



Avances de obra

Agregar Avance

Obra Finalizada



Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	02/2018	14/03/2018	100 %	100 %	685,159.48	685,159.48	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 22.80% al 03/2018



Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra


Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	10/2017	23/03/2018	0.43 %	0.43 %	131,457.16	139,461.46	Ejecución	Ver	Eliminar
002	11/2017	23/03/2018	3.06 %	4.23 %	928,556.29	1,515,657.83	Ejecución	Ver	Eliminar
003	12/2017	23/03/2018	6.56 %	7.36 %	1,989,201.61	2,537,172.01	Ejecución	Ver	Eliminar
004	01/2018	23/03/2018	11.42 %	10.81 %	3,461,458.05	3,657,770.75	Ejecución	Ver	Eliminar
005	02/2018	23/03/2018	17.71 %	16.04 %	5,367,996.93	5,358,513.02	Ejecución	Ver	Eliminar
006	03/2018	18/04/2018	25.80 %	22.80 %	7,818,709.38	7,573,341.22	Ejecución	Ver	Eliminar



Línea de tiempo

Avance físico real 75.77% al 03/2018

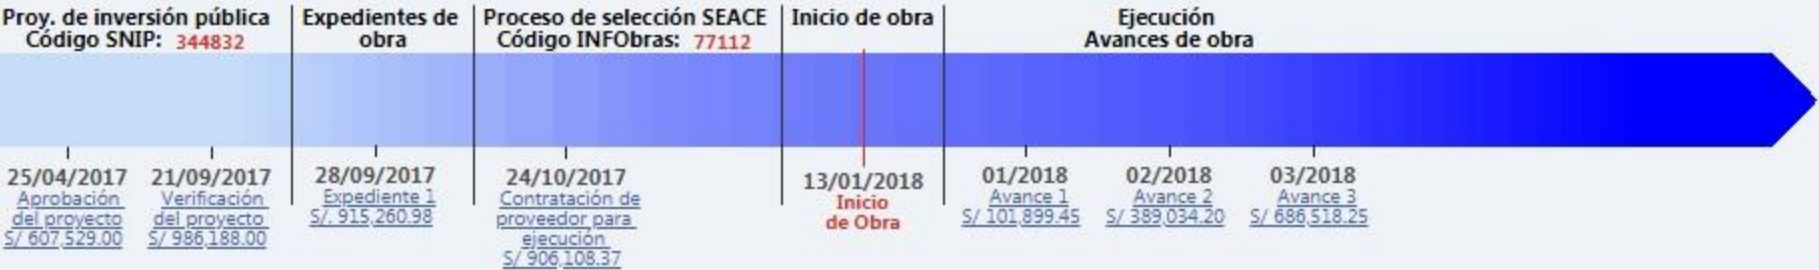

Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

Nº	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	01/2018	28/02/2018	6.11 %	11.25 %	55,381.84	101,899.45	Ejecución	Ver	Eliminar
002	02/2018	14/03/2018	31.30 %	42.93 %	228,204.13	389,034.20	Ejecución	Ver	Eliminar
003	03/2018	17/04/2018	66.23 %	75.77 %	600,067.04	686,518.25	Ejecución	Ver	Eliminar
