



1	2
----------	---

Línea de tiempo



Avances de obra

Agregar Avance Obra Finalizada ☒ Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
011	04/2018	18/05/2018	100 %	85.21 %	5,674,051.23	4,835,231.94	Ejecución	Ver	Eliminar
012	05/2018	05/07/2018	100 %	100 %	5,674,051.23	5,674,051.23	Ejecución	Ver	Eliminar

1 2

- **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA POSADA DE HUACACHINA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA”.**

Línea de tiempo



Avances de obra


Agregar Avance Obra Finalizada ☒ Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	04/2018	18/05/2018	46 %	77.64 %	158,236.69	267,067.01	Ejecución	Ver	Eliminar
002	05/2018	28/06/2018	89.81 %	100 %	308,935.01	343,983.57	Ejecución	Ver	Eliminar

➤ **“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES RELIGIOSOS Y DE TRADICIÓN RELIGIOSA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LUREN DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA”.**



Línea de tiempo

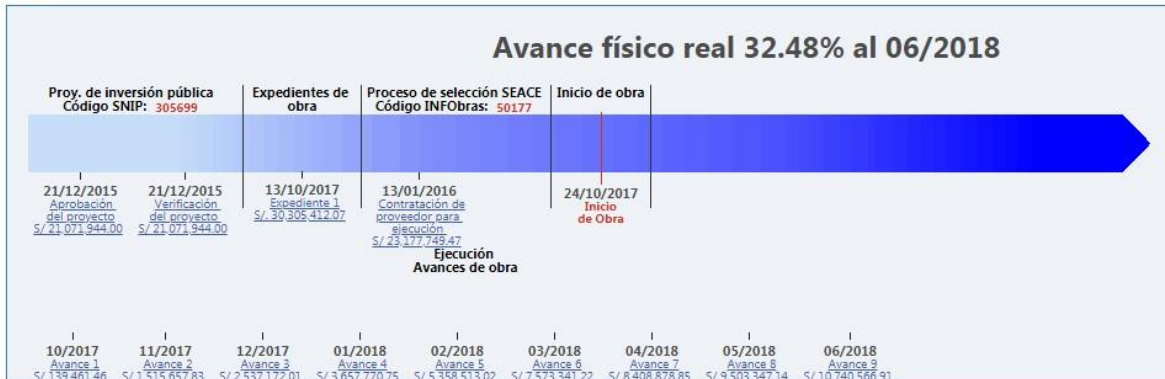

Avances de obra

Agregar Avance Finalizar Obra Obra paralizada									
N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	10/2017	23/03/2018	0.43 %	0.43 %	131,457.16	139,461.46	Ejecución	Ver	Eliminar
002	11/2017	23/03/2018	3.06 %	4.23 %	928,556.29	1,515,657.83	Ejecución	Ver	Eliminar
003	12/2017	23/03/2018	6.56 %	7.36 %	1,989,201.61	2,537,172.01	Ejecución	Ver	Eliminar
004	01/2018	23/03/2018	11.42 %	10.81 %	3,461,458.05	3,657,770.75	Ejecución	Ver	Eliminar
005	02/2018	23/03/2018	17.71 %	16.04 %	5,367,996.93	5,358,513.02	Ejecución	Ver	Eliminar
006	03/2018	18/04/2018	25.80 %	22.80 %	7,818,709.38	7,573,341.22	Ejecución	Ver	Eliminar
007	04/2018	18/05/2018	25.34 %	25.34 %	8,408,878.85	8,408,878.85	Ejecución	Ver	Eliminar
008	05/2018	15/06/2018	40.96 %	28.68 %	12,599,094.02	9,503,347.14	Ejecución	Ver	Eliminar
009	06/2018	09/07/2018	51.91 %	32.48 %	15,923,195.53	10,740,566.91	Ejecución	Ver	Eliminar

➤ **“MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA AVENIDA FERNANDO LEÓN ARECHUA DEL CERCADO DE ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA”.**

ESTA OBRA ESTUVO PARALIZADA Y HA REINICIADO SU EJECUCIÓN EL DÍA 12 DE JUNIO, SU AVANCE ES EL SIGUIENTE:

Línea de tiempo



Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	12/2017	12/01/2018	21.63 %	21.13 %	700,440.22	684,383.22	Ejecución	Ver	Eliminar
002	01/2018	19/03/2018	51.87 %	41.65 %	1,679,619.84	1,348,762.40	Ejecución	Ver	Eliminar
003	02/2018	19/03/2018	77.14 %	64.84 %	2,497,830.42	2,099,570.45	Ejecución	Ver	Eliminar
004	03/2018	27/04/2018	98.14 %	82.40 %	3,178,155.10	2,668,301.20	Ejecución	Ver	Eliminar
005	04/2018	18/05/2018	98.14 %	82.40 %	3,178,155.10	2,668,301.20	Paralizada	Ver	Eliminar
006	05/2018	28/06/2018	98.14 %	82.40 %	3,178,155.10	2,668,301.20	Paralizada	Ver	Eliminar
007	06/2018	12/07/2018	85.50 %	85.68 %	2,812,831.97	2,818,538.19	Ejecución	Ver	Eliminar

➤ "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA URBANIZACIÓN SAN JOAQUÍN VIEJO DEL DISTRITO DE ICA PROVINCIA DE ICA".

Línea de tiempo



Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	05/2018	04/07/2018	9.12 %	17.17 %	98,808.80	182,259.56	Ejecución	Ver	Eliminar
002	06/2018	11/07/2018	34.90 %	48.34 %	370,463.50	513,129.12	Ejecución	Ver	Eliminar

- ***“CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE PACHACUTEC, EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA”.***

ESTA OBRA YA SE HA INICIADO, PERO EN EL INICIO HA TENIDO UNA SERIE DE INCONVENIENTES EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE SE ENCUENTRA PARALIZADA.
